

Prüfprotokoll

Production\Produkt-10x60mm V2



Übersicht

Allgemein

Maschine	2766-001
Maschinen-ID	---
Rezeptur-Name	Production \Produkt-10x60mm V2
Bediener	sq
Prozess-Start	14.01.2021 13:03
Prozess-Ende	14.01.2021 13:36
Ergebnis	Erfolgreich

Sonstiges

Gesamtzeit (s)	1900
Badtemperatur beim Start (°C)	23,9
Bersttest	Erfolgreich
Berst-Druck (bar)	18,42
Leck.-Test	Erfolgreich
Leck. Druckabfall (bar)	-0,60
Compliance-Test	Erfolgreich

Artikel	Article Name 10x60mm
Artikel-Nr	1234
Lot	LOT-789
Bemerkung	inkl. Burst Test

Rezepturdetails

Start

Badtemperatur (°C)	24,0
Max. Toleranz Badtemperatur (± °C)	3,0
Volumen Testobjekt (ml)	5,0
Max. Füllmenge pro Schritt (ml)	20,0
Start-Druck (bar)	1,0
Max. Anzahl Befüllen	1

Compliance

Schritt 1

Test aktivieren	ein
Druck (bar)	4,0
Füllgeschwindigkeit (ml/s)	1,00
Druck halten	ja
Haltezeit Druck (s)	10,0
Druckerhöhung (bar)	2,0
Anzahl Durchläufe	4

Messpunkte

Manuelle Durchmesser-Erfassung	ja
Anzahl Messpunkte nach Erhöhung	3

Ermüdung

Schritt 1


Test aktivieren	ein
Druck (bar)	12,0
Füllgeschwindigkeit (ml/s)	1,00
Druck halten	nein
Haltezeit Druck (s)	10,0
Leck.-Erkennung	ja
Max. Leck.-Druckabfall (bar)	1,0
Entleergeschwindigkeit (ml/s)	5,00
Wartezeit nach Durchlauf (s)	10,0
Anzahl Durchläufe	5

Berst

Test aktivieren	ein
Start-Bestätigung erforderlich	ja
Start-Druck (bar)	5,0
Nominal-Druck (bar)	12,0
Füllgeschwindigkeit (ml/s)	1,00

Compliancetest


Phase (Schritt, Durchlauf, Messpunkt)	Druck (bar)	Durchmesser (mm)
Druckerhöhung 1, 1, distal	3,97	10,008
Druckerhöhung 1, 1, middle	3,97	10,005
Druckerhöhung 1, 1, proximal	3,98	9,857
Druckerhöhung 1, 2, distal	5,97	10,455
Druckerhöhung 1, 2, middle	5,97	10,478
Druckerhöhung 1, 2, proximal	5,97	10,172
Druckerhöhung 1, 3, distal	7,96	10,635
Druckerhöhung 1, 3, middle	7,95	10,642
Druckerhöhung 1, 3, proximal	7,95	10,420
Druckerhöhung 1, 4, distal	9,95	10,813
Druckerhöhung 1, 4, middle	9,93	10,886
Druckerhöhung 1, 4, proximal	9,96	10,535

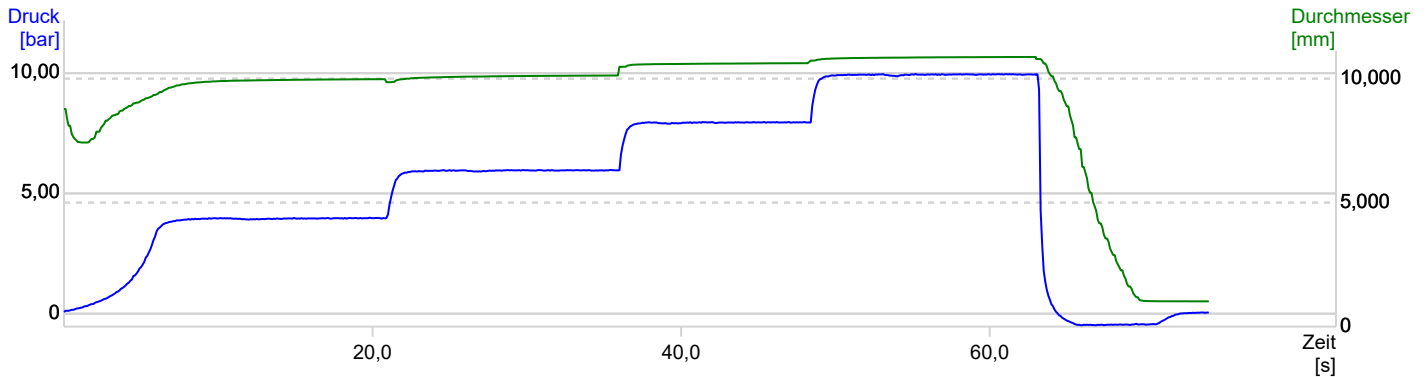

Fatiguetest

Leckage-Test bestanden. Leck.-Druckabfall: -0,60 bar

Schritt	Soll-Druck (bar)
1	12,0

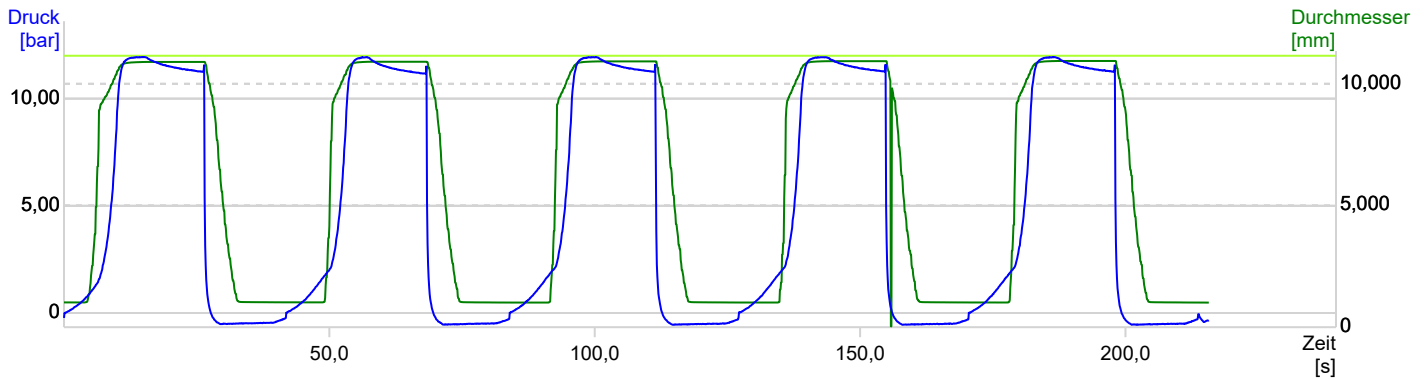

Bersttest

Bersttest bestanden. Berstdruck: 18,42 bar

